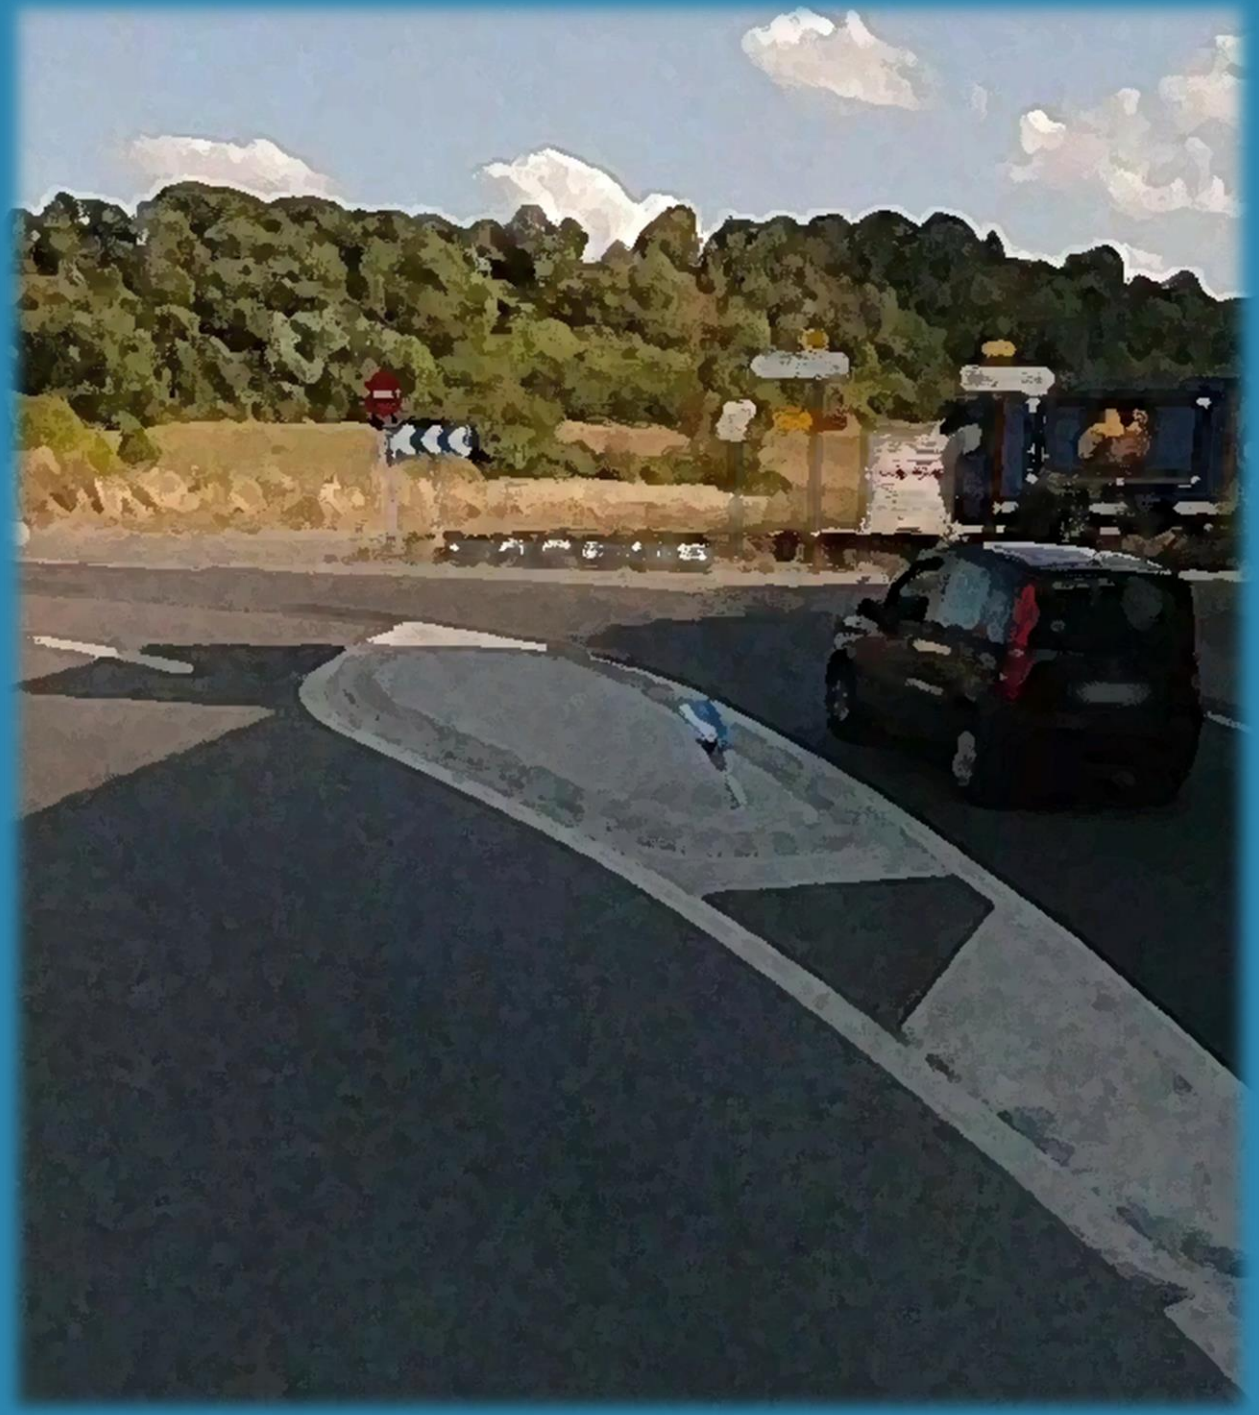

# Réunion Publique du
## 26 Juin 2025

RD.622 & RD.48E

**Création d'un GIRATOIRE**

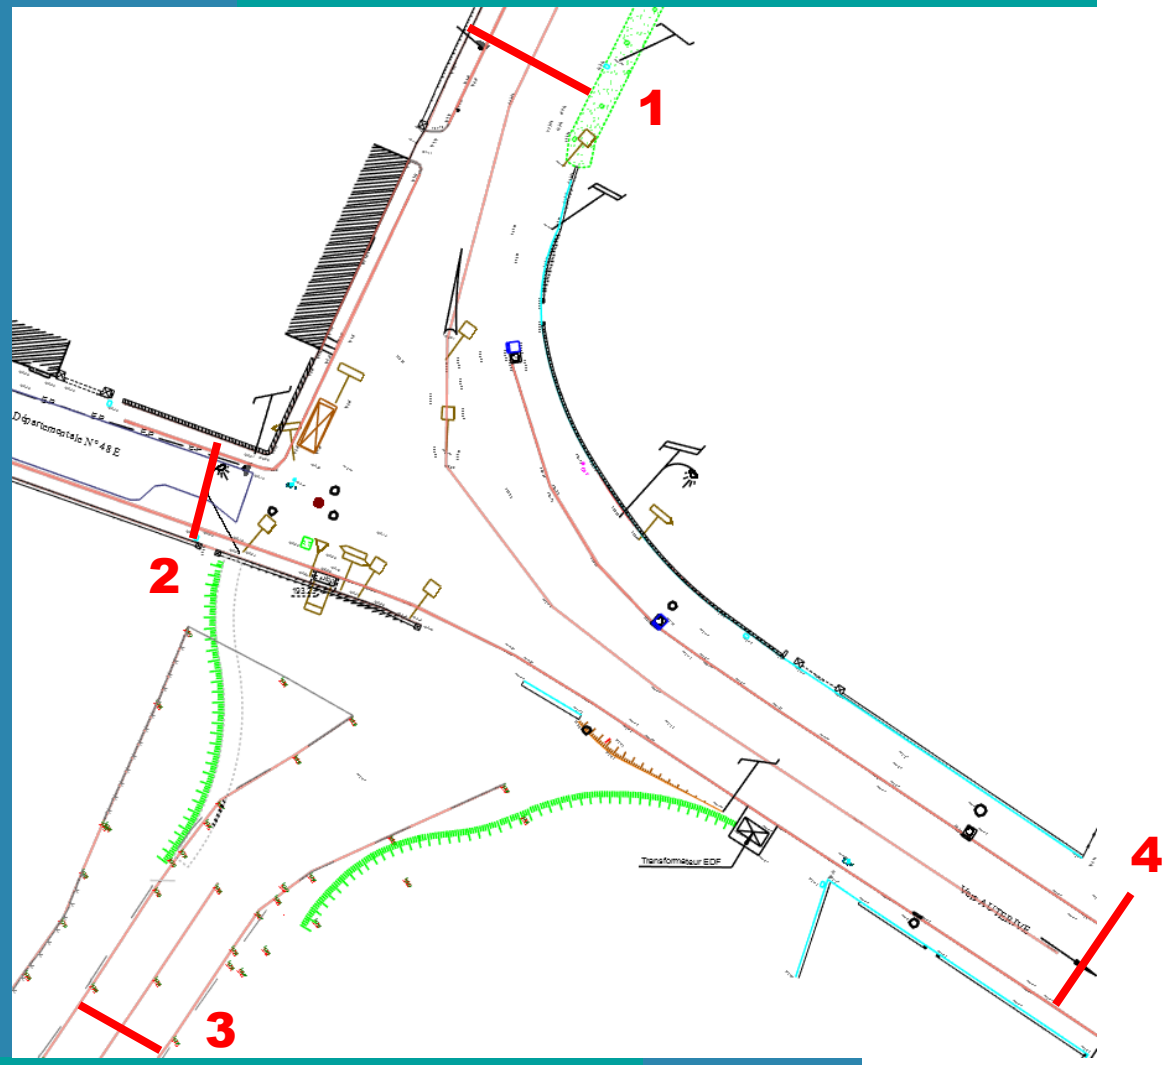


# Zone de Travaux Giratoire RD.622

- RD.622 Côté LONGAGES « Abords Accès N°14 »
- RD.48$^{E}$ Côté Centre CAPENS « Abords Aménagement existant »
- Route de LAYGAOU « Raccordement avec Voirie Existante
- RD.622 Côté St Sulpice « Abords Accès N°3 »

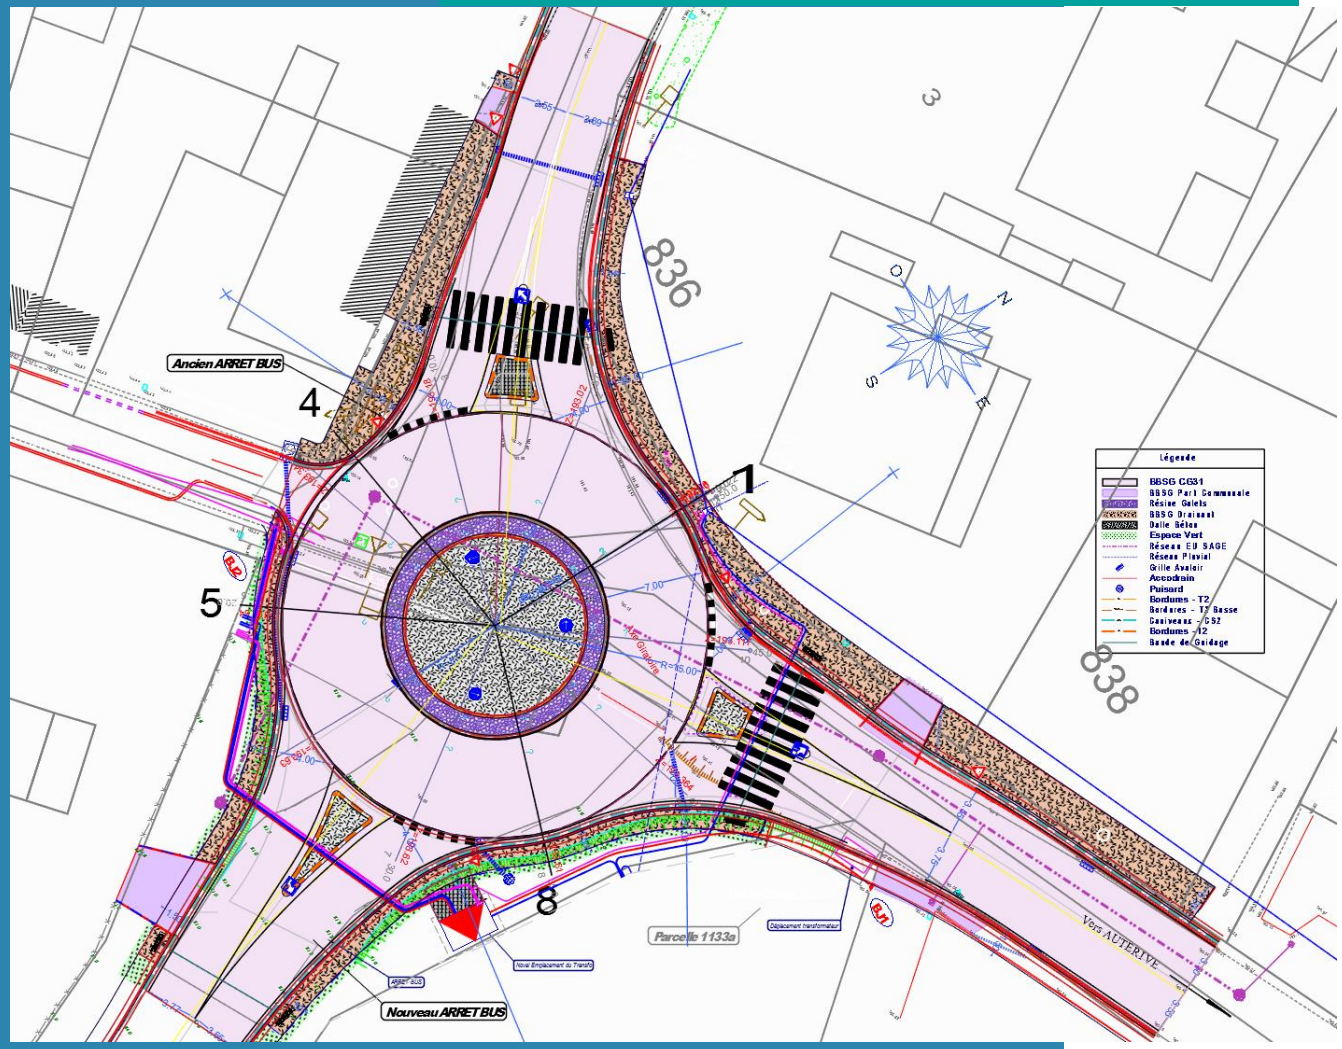


# Travaux d'Aménagement Giratoire RD.622

- Giratoire Intersections :
- RD.622, RD.48$^{E}$, Route de LAYGAOU
  - Giratoire à Grande Circulation
    - Anneau Central d'un Rayon de 6,50 ml
    - Anneau zone franchissable d'un Rayon de 8,00 ml
    - Giratoire d'un rayon extérieur de 15,00 ml
      - Soit 7,00 de Voirie
  - Anneau Central en Béton avec Inscription « CAPENS »
  - Zone Franchissable en résine imitation Galets
  - Trottoir PMR de 1,40 de largeur minimum en BBSG 0/10 Couleur Grège
  - Gestion des accès des riverains en BBSG 0/10 Noir
  - Ilots en Galets maçonnés
  - Déplacement de l'Arrêt de Bus
  - Déplacement du Transformateur
  - Déplacement Réseau Orange & Fibre
  - Réfection Réseau Eaux Usées
  - Réfection Réseau AEP
  - Réfection pour Eclairage Public

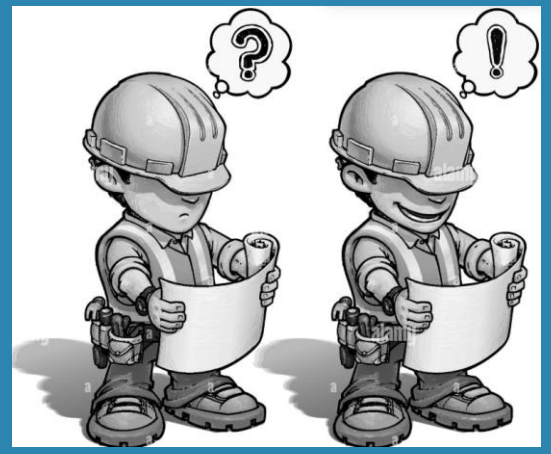

# Travaux d'Aménagement Giratoire RD.622

- Planning Travaux :
  - L'Entreprise BOUYGUES à réaliser la majorité de ses attentes en termes de fourreaux
  - Eau Potable SIECT / BAYOL
    - 23/06/2025 - 18/07/2025
  - Eaux Usées SAGE / EHTP
    - 15/07/2025 - 08/08/2025
  - Orange ENSIO / FIBRE 31 / ALTI INFRA
    - Durant la période 15/07/2025 - 15/08/2025
    - 1 semaine de travaux maximum
  - Terrassements CD.31 / NAUDIN
    - 25/08/2025 - 29/08/2025
  - SDEHG / BOUYGUES Câblage
    - 01/09/2025 - 05/09/2025
  - MAIRIE / ETPM Travaux d'aménagement Giratoire
    - 15/09/2025 - 31/10/2025
  - SDEHG / BOUYGUES Raccordement & Déplacement Transfo
    - 13/10/2025 - 17/10/2025
  - CD.31 / EIFFAGE Enrobés – Travaux de Nuit
    - 03/11/2025 - 07/11/2025

# Travaux d'Aménagement Giratoire RD.622

- Planning Travaux :
  - L'Entreprise BOUYGUES à réaliser la majorité de ses attentes en termes de fourreaux
  - Eau Potable SIECT / BAYOL
    - 23/06/2025 - 18/07/2025
  - Eaux Usées SAGE / EHTP
    - 15/07/2025 - 08/08/2025
  - Orange ENSIO / FIBRE 31 / ALTI INFRA
    - Durant la période 15/07/2025 - 15/08/2025
    - 1 semaine de travaux maximum
  - Terrassements CD.31 / NAUDIN
    - 25/08/2025 - 29/08/2025
  - SDEHG / BOUYGUES Câblage
    - 01/09/2025 - 05/09/2025
  - MAIRIE / ETPM Travaux d'aménagement Giratoire
    - 15/09/2025 - 31/10/2025
  - SDEHG / BOUYGUES Raccordement & Déplacement Transfo
    - 13/10/2025 - 17/10/2025
  - CD.31 / EIFFAGE Enrobés – Travaux de Nuit
    - 03/11/2025 - 07/11/2025

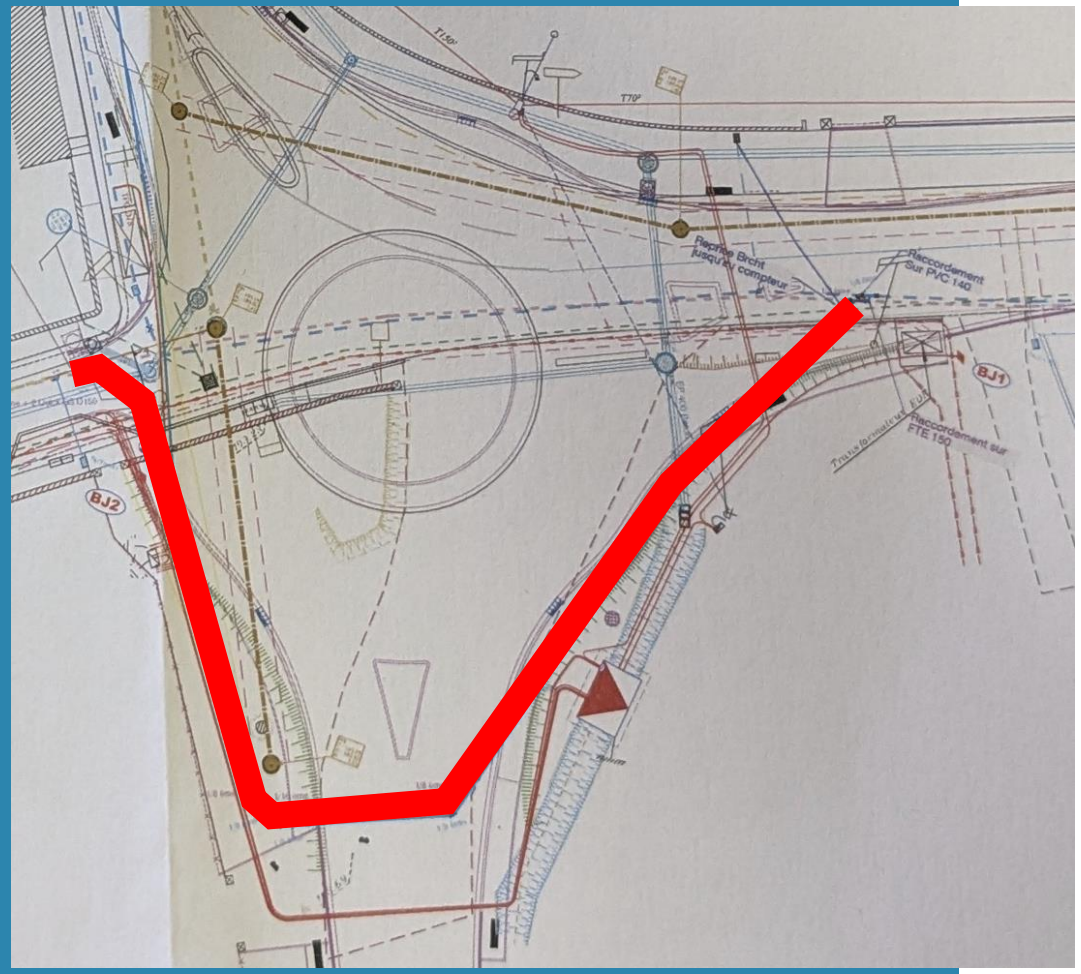


# Zone de Travaux Giratoire RD.622

- **RESEAU AEP**

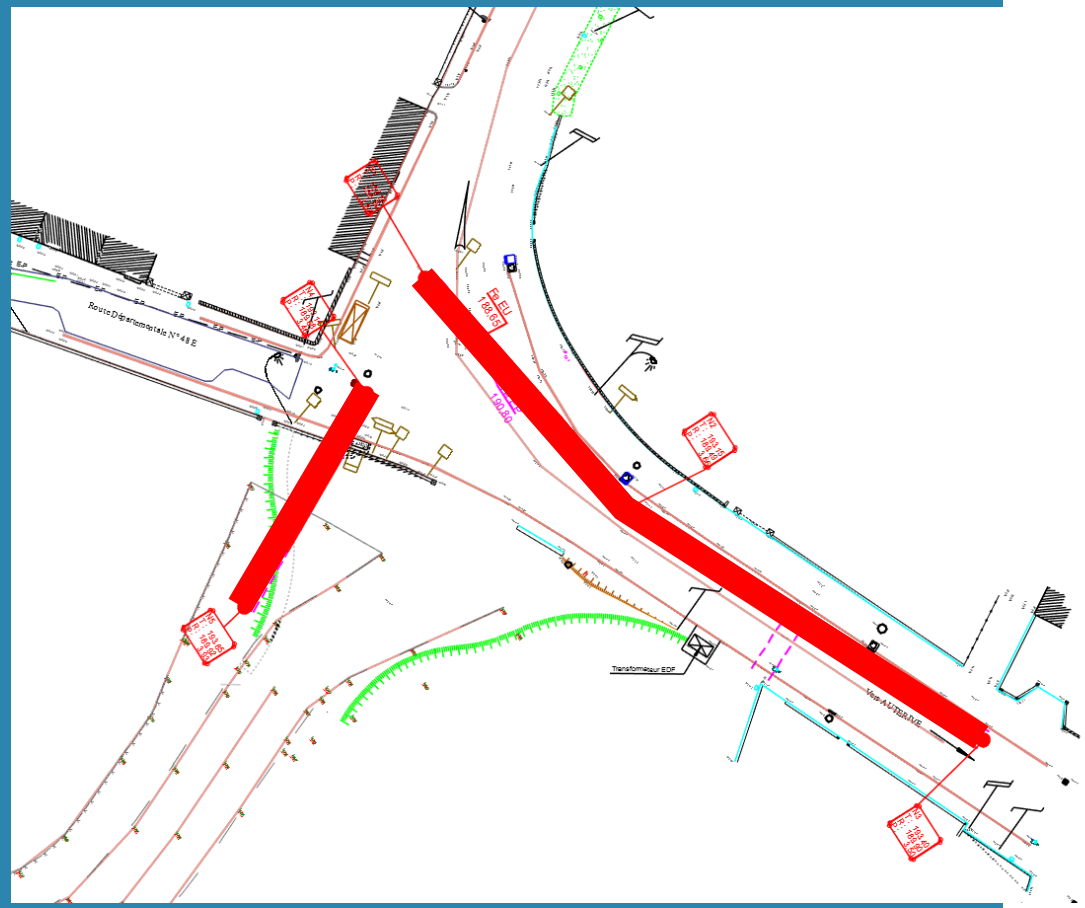


# Zone de Travaux Giratoire RD.622

- **RESEAU Eaux Usées**

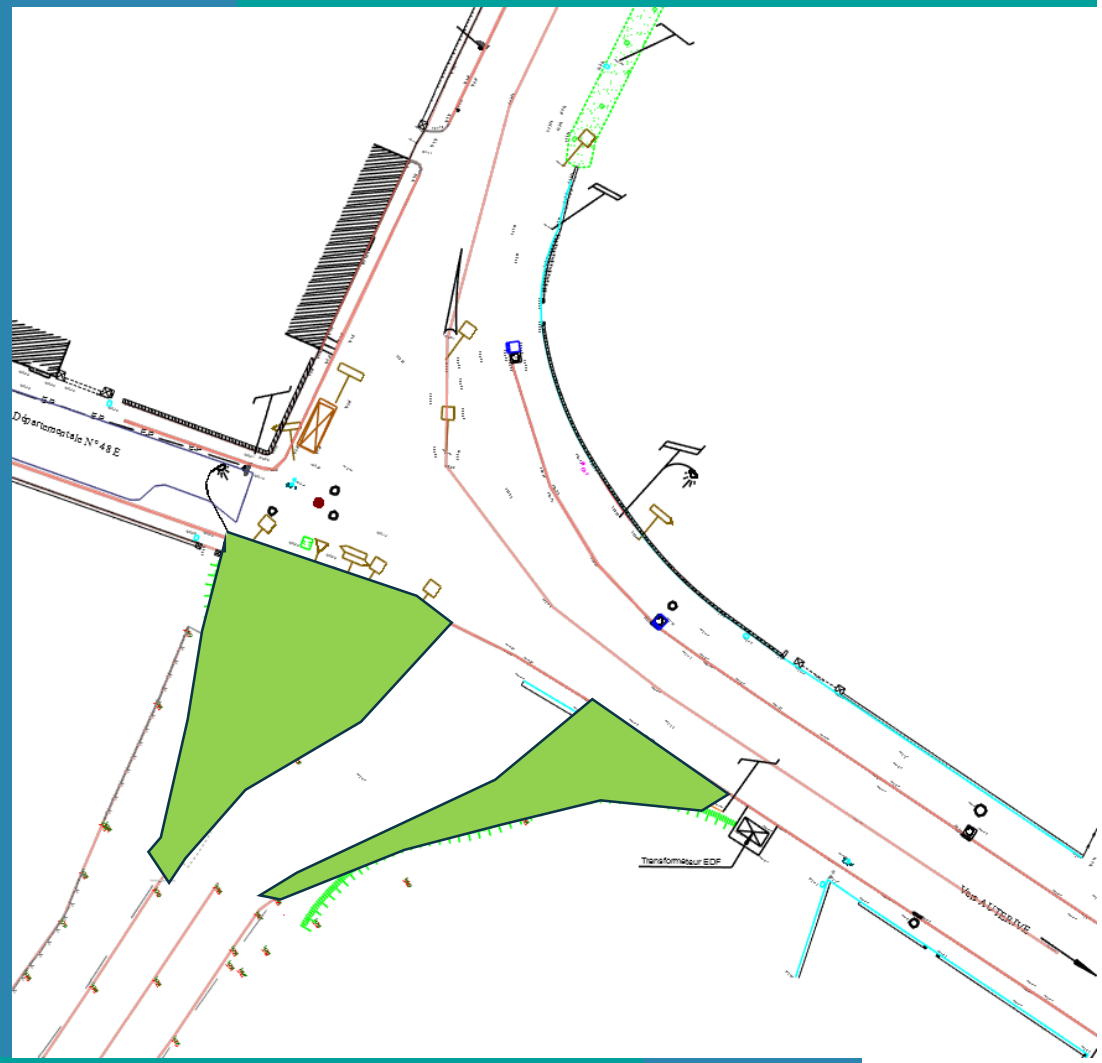


# Zone de Travaux Giratoire RD.622

- **CD.31 Terrassement**

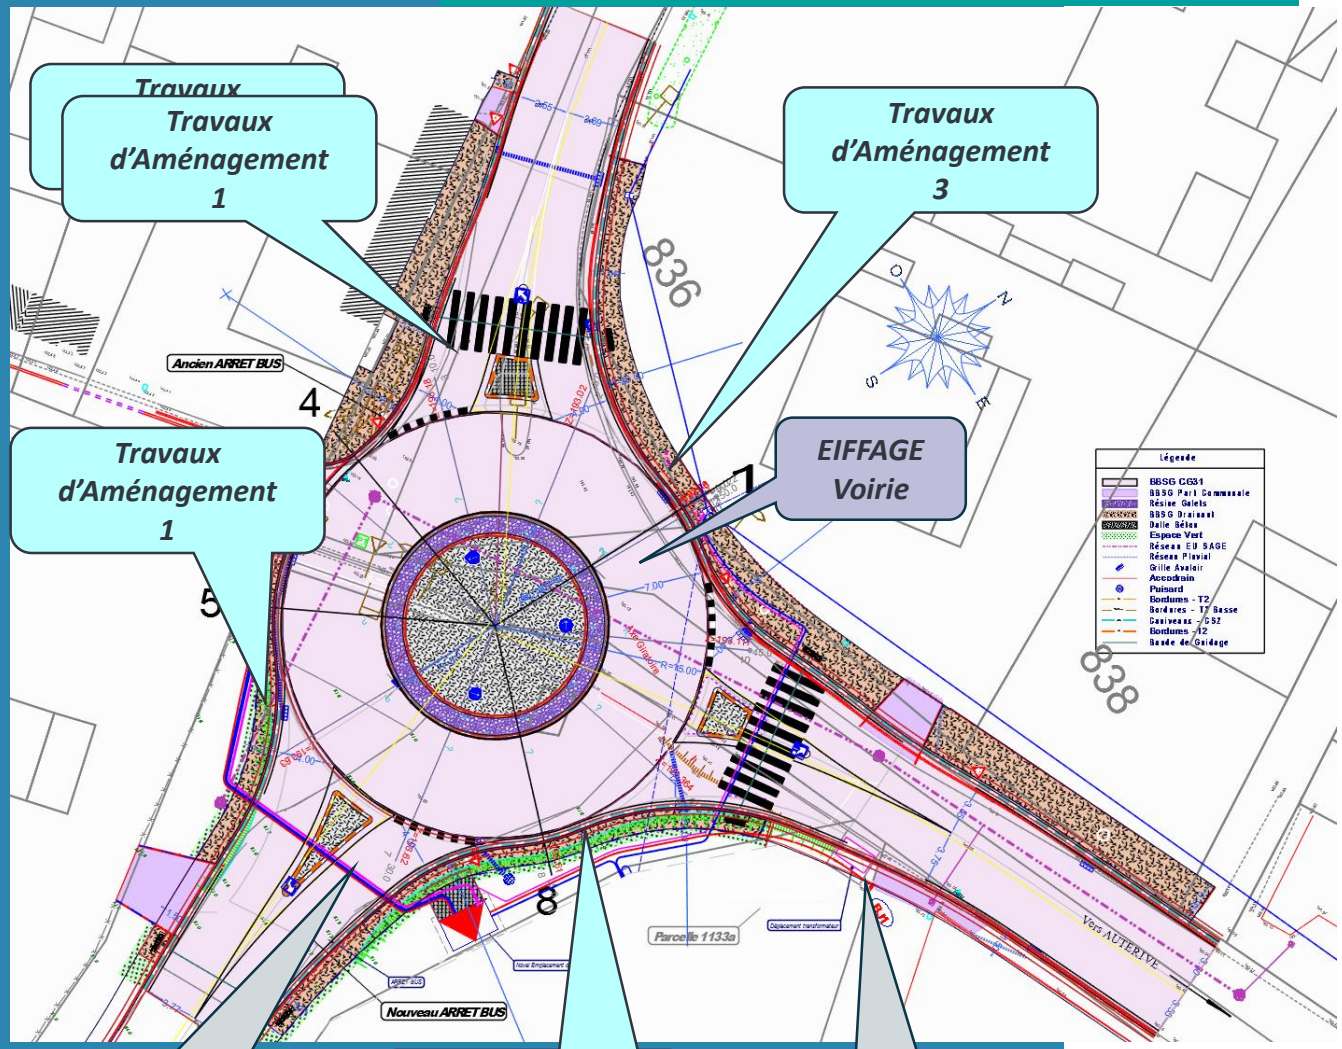


# Zone de Travaux Giratoire RD.622

- **BOUYGUES**
- **ETPM pour Mairie**
- **EIFFAGE pour CD.31**

# Travaux d'Aménagement Giratoire RD.622

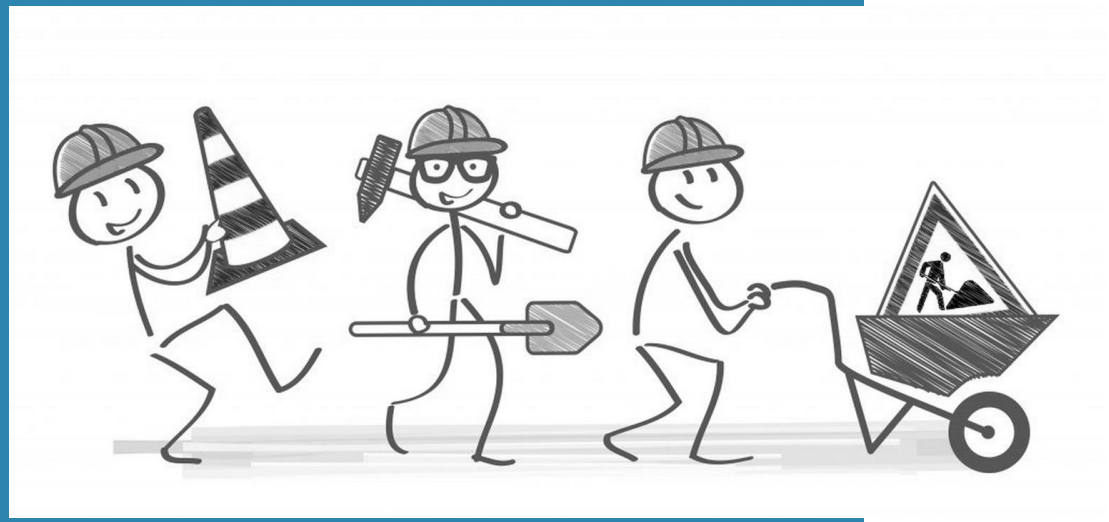

- Gestion Circulation:
  - 23/06/2025 - 11/07/2025 - ALTERNAT
  - 15/07/2025 - 08/08/2025 - ROUTE BARREE
  - 09/08/2025 - 24/08/2025 - OUVERT A LA CIRCULATION
  - 25/08/2025 - 29/08/2025 - ROUTE BARREE
  - 30/08/2025 - 31/08/2025 - OUVERT A LA CIRCULATION
  - 01/09/2025 - 05/09/2025 - ALTERNAT
  - 06/09/2025 - 14/09/2025 - OUVERT A LA CIRCULATION
  - 15/09/2025 - 02/11/2025 - ALTERNAT
  - 03/11/2025 - 06/11/2025 - ROUTE BARREE 2 NUITS

- **07/11/2025 OUVERTURE GIRATOIRE**

# DEVIATIONS DURANT ROUTE BARREE

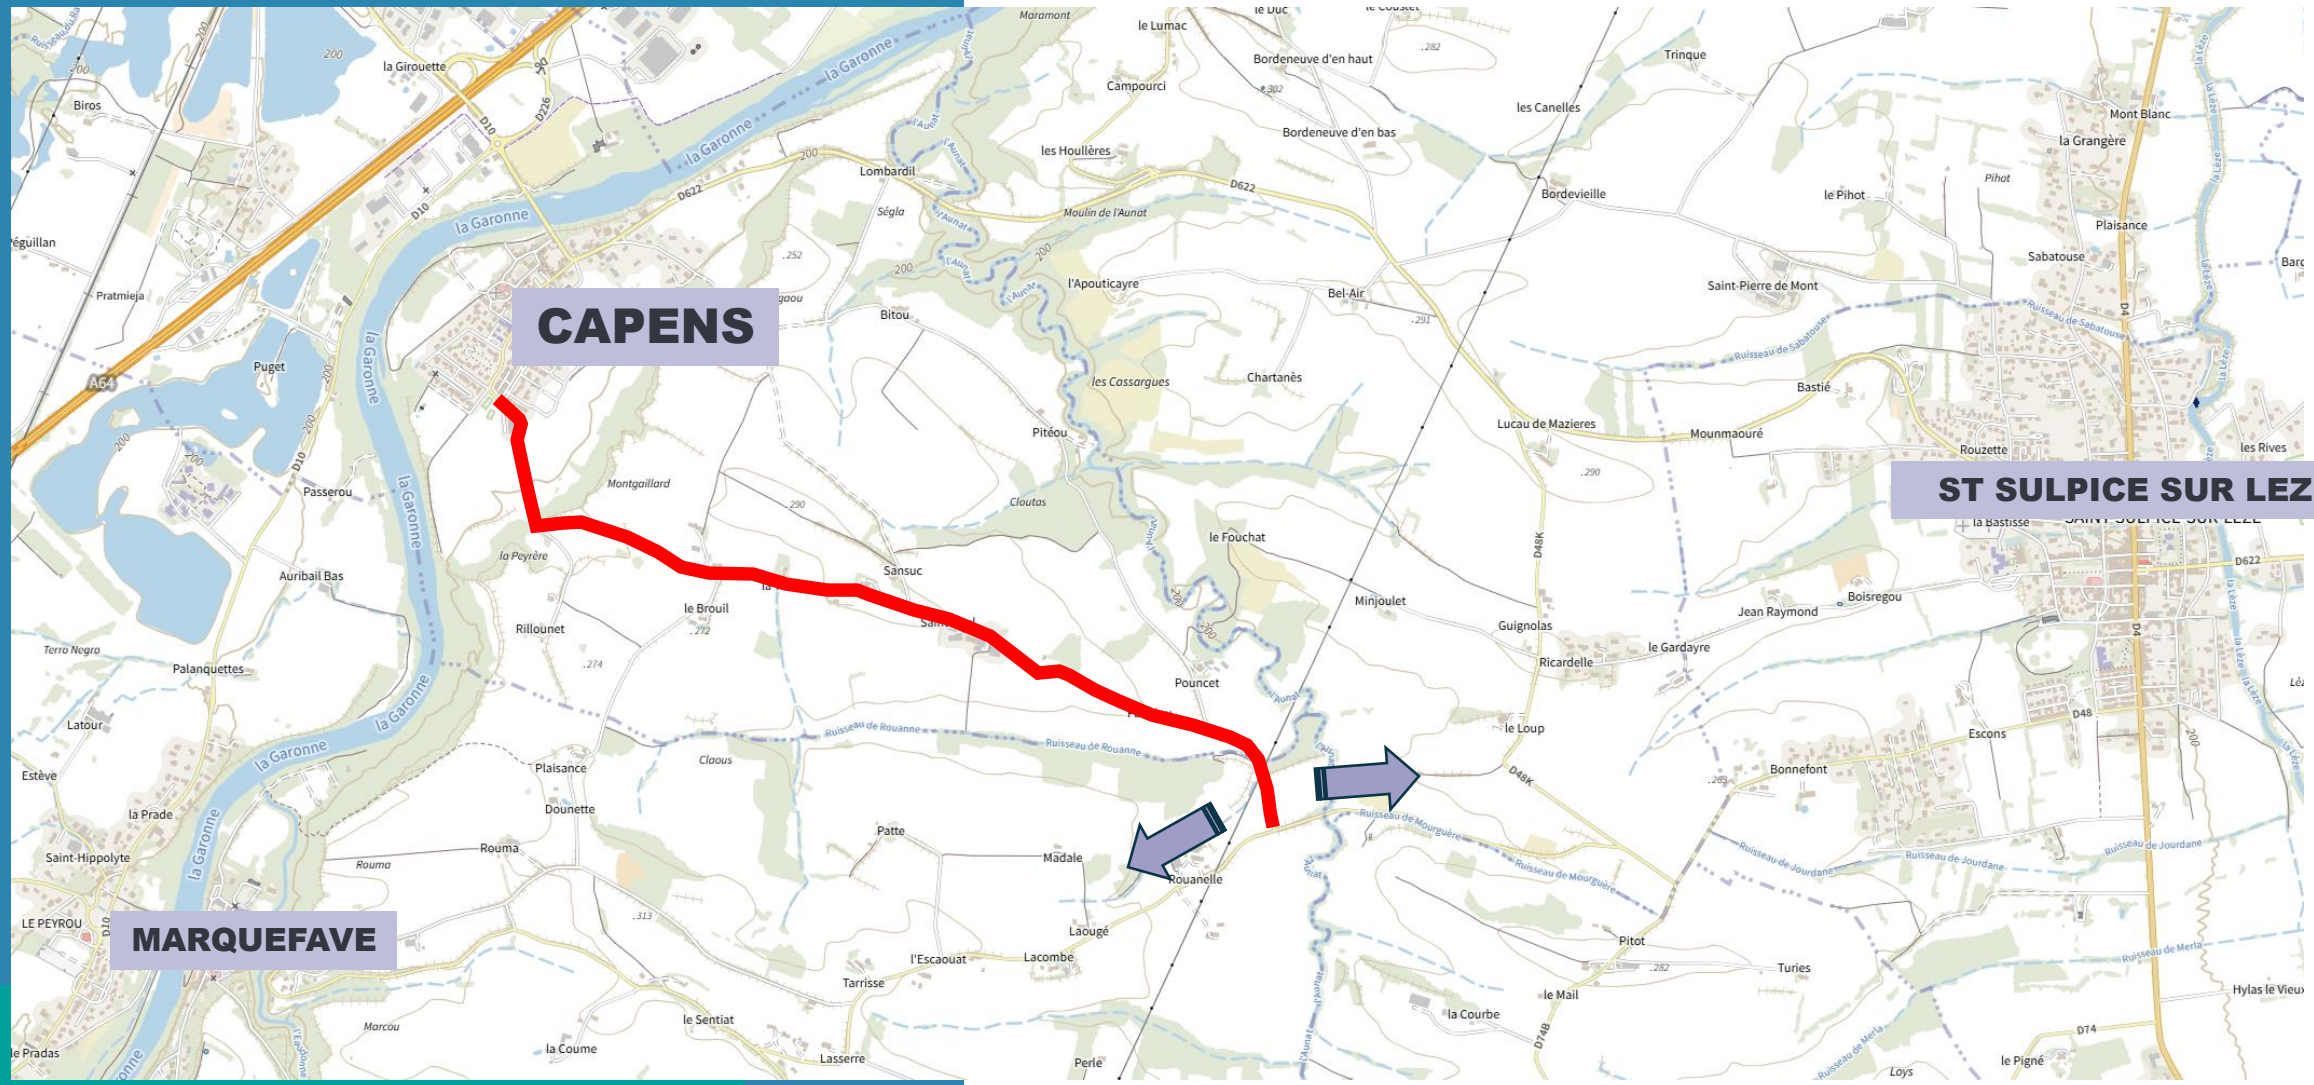

# DEVIATIONS DURANT ROUTE BARREE

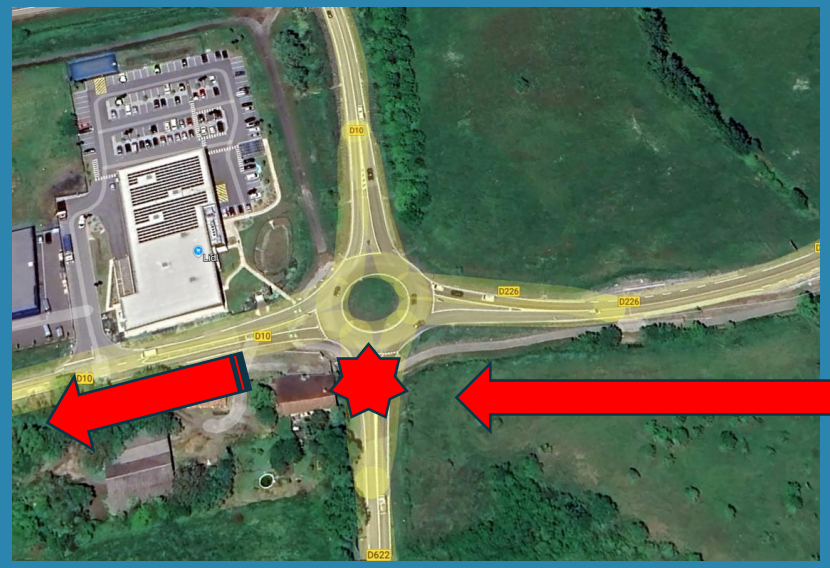

Depuis le Giratoire pour VL

- Déviation RD.10 vers Marquefave
- Possibilité d'accès pour Riverains N°4, N°6 & N°14

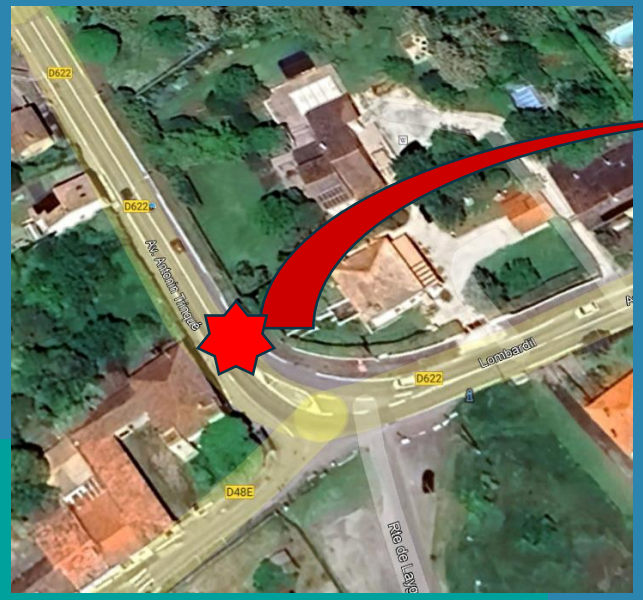

# DEVIATIONS DURANT ROUTE BARREE

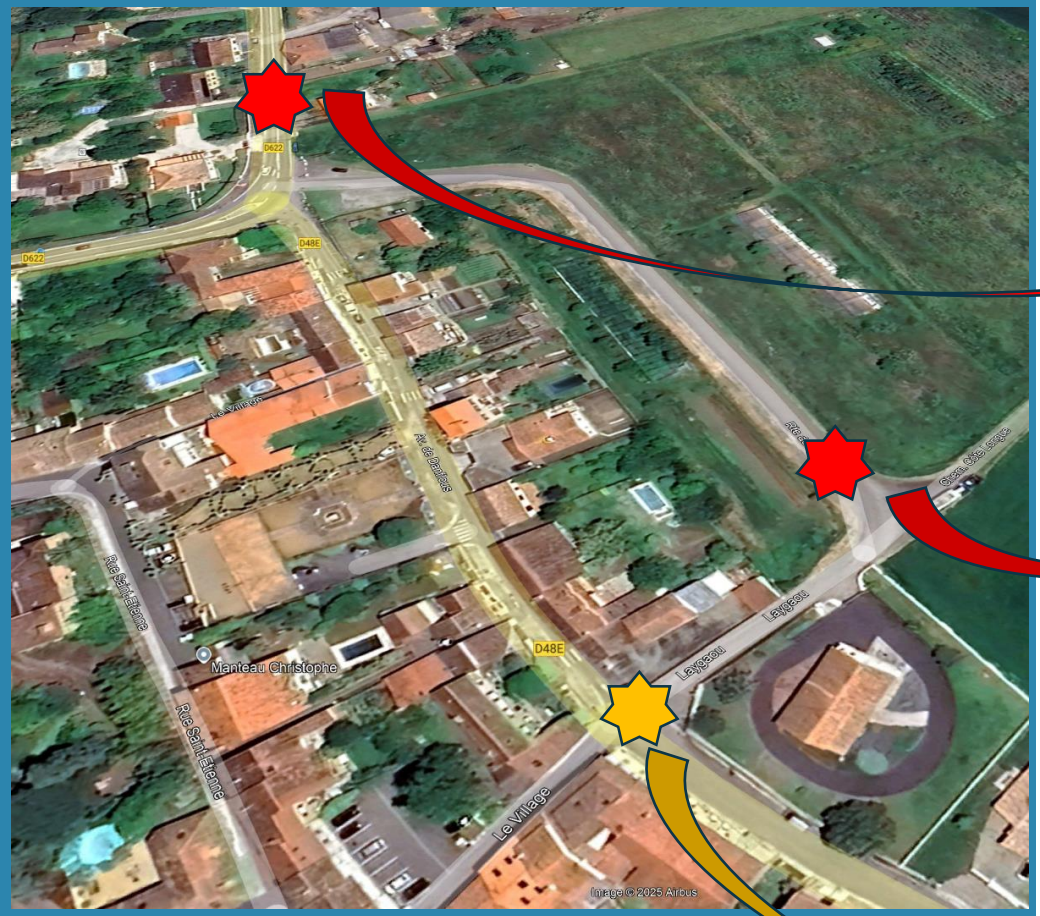

RD.622 venant de St Sulpice sur Lèze

- Adaptation en fonction de l'avancement du chantier pour Riverains N°1 &N°16

# ALTERNAT DURANT TRAVAUX HORS Route Barrée

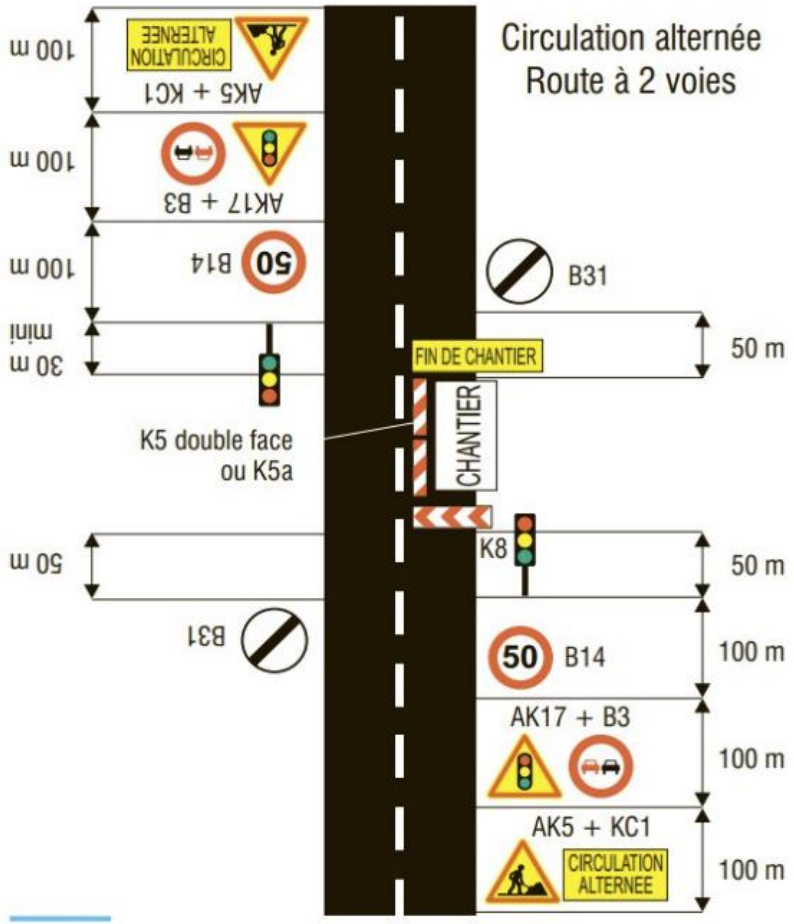


**Schéma de Principe**

**Remarques**

> Le schéma à appliquer notamment lorsque l'alternat doit être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.

> Un panneau AK3 pourra compléter le dispositif dans le cas d'une mauvaise visibilité en application du principe d'adaptation.

> **Dans le cas des enduits superficiels, des panneaux AK4 et AK22 viennent compléter les panneaux AK5 pendant et après le chantier.**
